https://tuxpan.gob.mx/wp-content/uploads/2023/08/REPORTE-SUPERVISON-OBRA-ANEXOS-DE-PARTISIPACION-SOCIAL-MTN-18-R23-001-2023.pdf

28 de abril de 2023.

REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA.


DATOS GENERALES:


- **Nombre de la obra:** BACHEO ASFALTICO EN CALLE HIDALGO OTE. ENTRE CALLE REFORMA SUR Y CALLE MÉXICO NTE. EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN; NAYARIT;
- **Número de contrato:** MTN-18-R23-001/2023-AD;
- **Adjudicación:** A la empresa del C. LUIS GILBERTO CÁRDENAS RIVAS.
- **Monto de la obra:** $151,170.36 (Ciento Cincuenta y Un Mil Ciento Setenta pesos 36/100 M.N.) IVA incluida.
- **Periodo de ejecución:** De 12 días naturales que comprendiendo del 17 de abril de 2023 al 28 de abril de 2023.

PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Inicio de la obra:

Para el inicio de los trabajos de la obra, se observa a personal, maquinaria y herramienta suficiente en el tramo de la calle Hidalgo esquina con Reforma para reparar la superficie daña.

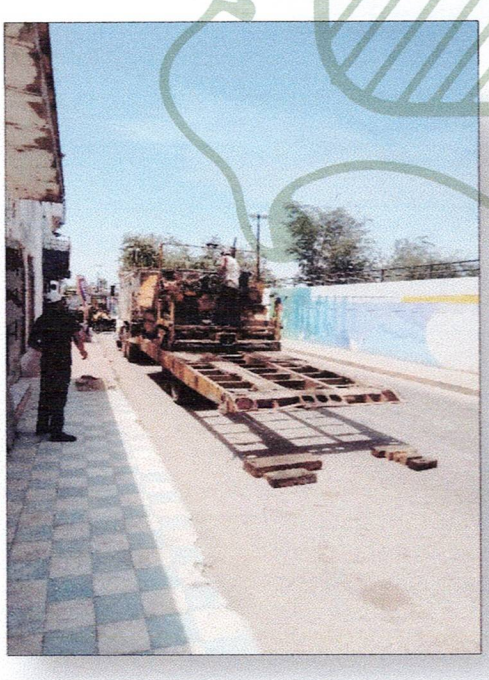


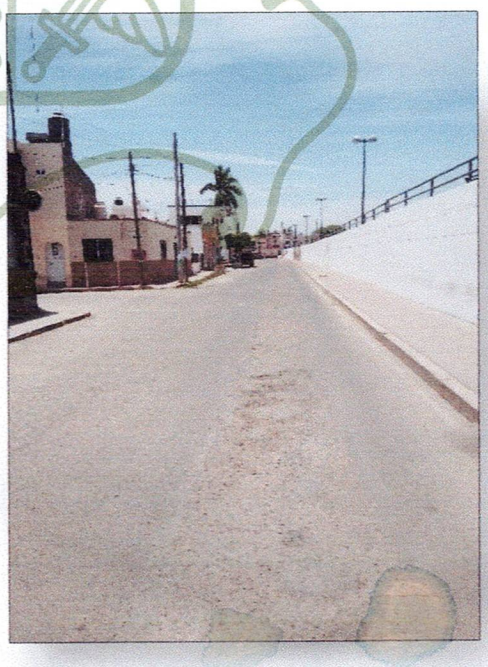


Durante la ejecución de la obra:


Se observa el área de trabajo limpia, personal capacitado manejando la petrolizadora para realizar el riego de liga con emulsión asfáltica ECR-60 A razón de 0.60 – 0.90 lts/m2 en las áreas a bachear.

Personal realizar el poreo en las áreas que ya cuentan con el riego de liga, se puede visualizar a la pavimentadora finisher tender la mezcla asfáltica en caliente de 1/2", personal capacitado compacta con el compactador de rodillo las áreas donde ya se encuentra la mezcla asfáltica tendida.

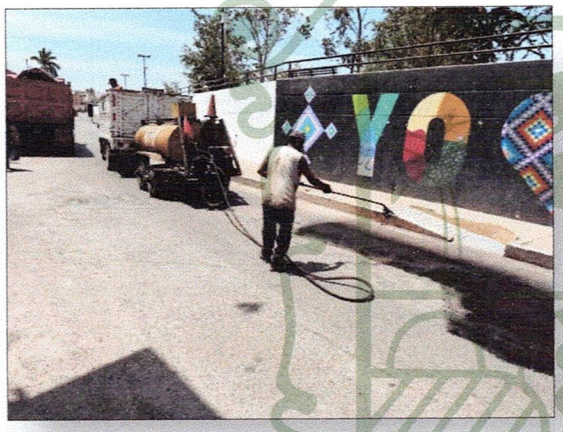

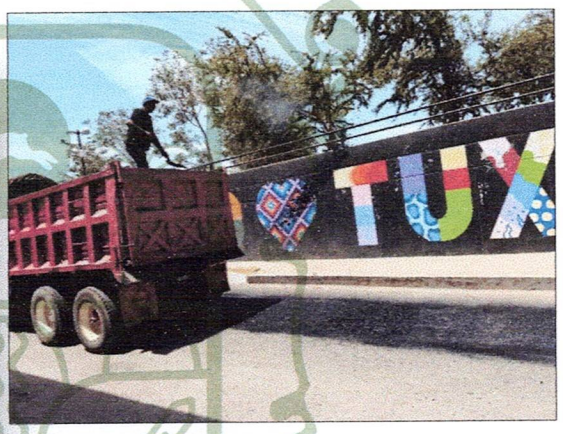





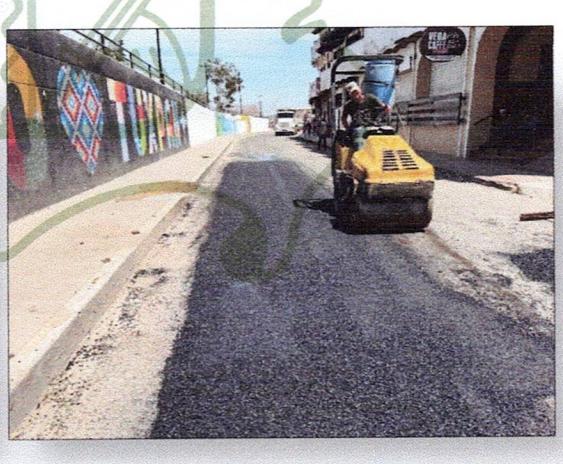

Conclusión de la ejecución de la obra:

Se concluye que ya se encuentran finalizados los trabajos que comprenden de 364.00 metros cuadrados de bacheo en la calle Hidalgo entre las calles Reforma sur y México norte de la localidad de Tuxpan, municipio de Tuxpan Nayarit.
Se puede visualizar que no se encuentran desperfectos en la superficie, observando esto se afirma que se encuentran completamente desarrollados al 100% y operando correctamente todos los trabajos.

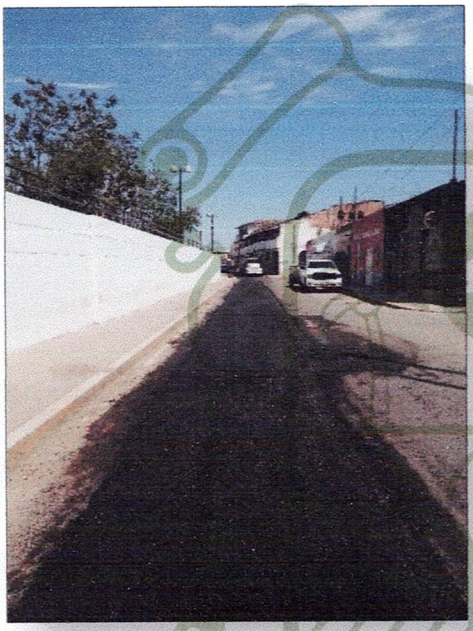

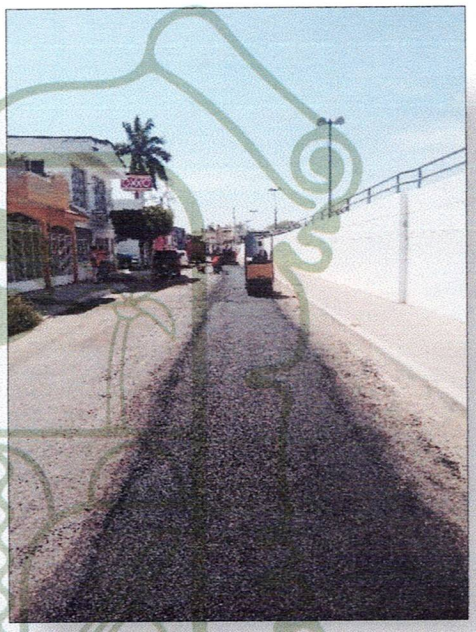

Supervisor de obra.
ING. GUSTAVO CERVANTES BENITEZ.

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

1.1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Siendo el día 10 del mes de abril del año 2023, a las 10:00 horas en el domicilio Calle Hidalgo Esq. Con constitución S/N, localizado en el municipio Tuxpan, de la entidad federativa Nayarit, nos encontramos reunidos para celebrar la instalación del Comité de participación social que dará seguimiento y verificación a la obra de nombre Bacheo asfaltico en calle Hidalgo en la localidad de Tuxpan, Nay a realizarse con recursos del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

DATOS DE LA OBRA *Esta sección deberá ser llenada por la supervisión de obra		
Fecha de llenado: 10 de Abril de 2023		
Nombre de la obra: Bacheo asfaltico en calle Hidalgo Ote. entre calle reforma sur y calle Mexico Nte. en la localidad de Tuxpan, Municipio de Tuxpan, Nayarit.		
Número de expediente asignado: TUXPAN-RR3-001-2023 Monto total planeado: $151,400.00		
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 17/04/2023	Fecha de conclusión: 28/04/2023
Entidad: Nayarit	Municipio: Tuxpan	Localidad: Tuxpan

CONSIDERANDOS

Que las autoridades locales y personas servidoras públicas que apoyen en los procesos relacionados con el Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera, deberán:

- Promover la participación de la población beneficiaria a través de la integración de los Comités de participación social (CPS) durante los procesos de identificación de necesidades, planeación, ejecución y seguimiento de las obras a realizar con el Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera conforme al artículo 33, apartado B, fracción II, inciso b) de la Ley de Coordinación Fiscal.

- Capacitar a los CPS sobre los objetivos del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera, su población objetivo, labores y responsabilidades de los CPS.

- Publicar los anexos de participación social en el sitio oficial del ayuntamiento Municipal.

Que los Comités de participación social (CPS):

- Son órganos de participación y representación ciudadana rural, urbana, indígena o afromexicana, integrados equitativamente por mujeres y hombres en la mayoría de sus diversidades, electos de manera democrática para dar seguimiento a las obras financiadas con recursos del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera. También se reconocen como tales a las distintas formas de organización ciudadana con las que ya cuenta una localidad, siempre y cuando se apeguen a los criterios de la Guía de participación social vigente publicada por Bienestar.

- Su objetivo es dar seguimiento al inicio, desarrollo y conclusión de las obras/acciones a realizar con recursos del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera, para contribuir a que los recursos se utilicen bajo los principios de transparencia, economía, eficacia, legalidad y honradez.

- Deberán estar conformados por personas de la localidad donde se realice la obra y que no estén desempeñando un cargo público.

- La participación de la ciudadanía en los CPS no es remunerada; se trata de cargos honoríficos de servicio a la comunidad.

Que las actividades de los CPS son:

- Participar en la capacitación que brindará el gobierno local sobre las responsabilidades como integrantes de los CPS y de las obras a las que darán seguimiento.

- Participar en los procesos de planeación de proyectos en coordinación con las autoridades locales, mientras se apeguen a los Lineamientos del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera y a la disponibilidad de recursos.

- Realizar visitas a las obras e informar de sus avances, así como de la conclusión de las mismas a la ciudadanía.

- Registrar el seguimiento de las obras mediante el correcto llenado de los anexos de participación social vigentes.

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

ACUERDO ÚNICO

Se declara formalmente instalado el Comité de participación social conformado por las personas que al calce de este documento firman.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Guillermo Landa Mazariegos
Presidenta(e)
Nombre completo y firma

Luis Alberto
Luis Alberto Cedano Benitez
Secretaria(o)
Nombre completo y firma

Mijael A. Ramos
Vocal
Nombre completo y firma

Carlos Abel Garcia B
Carlos Abel Garcia Brambila
Vocal
Nombre completo y firma

Miguel Angel Perez Leyva
Vocal
Nombre completo y firma

Gustavo Cervantes Benitez
Supervisor de obra
Nombre completo y firma

Testigo
Nombre completo y firma

Testigo
Nombre completo y firma

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

1.2.

REPORTE DE CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

DATOS DE LA CAPACITACIÓN *Esta sección deberá ser llenada por la supervisión de obra		
Fecha y hora de la capacitación: 10 de Abril de 2023 11:00 A.M.		
Lugar de la capacitación: Sala de reuniones de la DGIDS.		
Nombre y cargo de la persona facilitadora: Salvador Lares Lizarraga Director General de Infraestructura y desarrollo sustentable.		
Número de asistentes a la capacitación	Mujeres: 0	Hombres: 5

INFORMACIÓN SOBRE LA CAPACITACIÓN *Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

Responda las siguientes preguntas tachando el recuadro correspondiente:

1. ¿La obra fue acordada con las personas del CPS y de la localidad beneficiaria? Sí [x] No [ ]

2. Indique cuáles de los siguientes temas les fueron proporcionados durante la capacitación:

   a) ¿Qué es el Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera, a quiénes beneficia, qué tipos de obras se pueden realizar con él y cuál es la importancia de que la ciudadanía participe? Sí [x] No [ ]

   b) ¿Cuáles son sus actividades y responsabilidades como integrantes del CPS? Sí [x] No [ ]

   c) Características básicas de la obra: cuándo inicia, cuándo termina, cuánto va a costar, cómo quedará al finalizar. Sí [x] No [ ]

   d) ¿Se entregaron los trípticos de participación social y de información del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera a todo el CPS? Sí [x] No [ ]

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

DATOS DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
Nombre de C. Presidenta/e: Guillermo Landa Mazariegos
Domicilio y número telefónico: Queretaro #24, Zona Centro C.P 63200, Tuxpan, Nay Tel: 323 132 5349
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☐ NO ☑ En caso de responder sí, indique a cuál.
Nombre de C. Secretaria/o: Luis Alberto Cedano Benitez
Domicilio y número telefónico: Calle Leona Vicario S/N Col. Ricardo Flores Magon 63242 Tuxpan. Nay. Tel: 323 100 7207
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☐ NO ☑ En caso de responder sí, indique a cuál.
Nombre de C. Vocal: Carlos Abel Garcia Brambila
Domicilio y número telefónico: Naranso Mendoza #307. Col. Centro Tuxpan Nayarit. Tel: 323 124 1486
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☐ NO ☑ En caso de responder sí, indique a cuál.
Nombre de C. Vocal: Miguel Angel Perez Leyva
Domicilio y número telefónico: Calle 12 de Octubre Ote 8. Mza. 43 Tuxpan, Nayarit Tel: 323 232 2562
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☐ NO ☑ En caso de responder sí, indique a cuál.
Nombre de C. Vocal: Jose Luis Reyez Zarate
Domicilio y número telefónico: And. Mz. F8B Col. Emiliano Zapata 63200 Tuxpan, Nay. Tel: 323 131 9864
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☐ NO ☑ En caso de responder sí, indique a cuál.

¿Para qué utilizaremos sus datos personales?

La Dirección General de Infraestructura y Desarrollo Sustentable, Nayarit utiliza los datos personales para dar seguimiento a la participación social mediante mecanismos internos apegados a los Lineamientos del Fondo, no se harán públicos y serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable.

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA *Esta sección deberá ser llenada por la supervisión de obra.			
Fecha de llenado: 17 de Abril de 2023			
Nombre de la obra: Bacheo asfaltico en calle Hidalgo Ote entre calle reforma sur y calle Mexico Nte. en la localidad de Tuxpan, Municipio de Tuxpan, Nayarit.			
Número de expediente asignado: TUXPAN-R23-001-2023		Monto total planeado: $151,100.00	
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 17/04/2023	Fecha de conclusión: 28/04/2023	
Entidad: Nayarit	Municipio: Tuxpan	Localidad: Tuxpan	

SEGUIMIENTO DE LA OBRA *Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. Describan con sus propias palabras en qué consiste la obra que supervisan.

Reparacion de baches por calle Hidalgo en Tuxpan Nay.

2. Describan con sus propias palabras de qué manera beneficiará la obra a la localidad.

Mejorara la vista del municipio y la fluides del trafico.

3. ¿La obra inició en la fecha que informó la autoridad local? Sí [✓] NO [ ]

3a. En caso de que no, ¿qué justificación dio la autoridad local?

4. Indiquen si existió algún cambio en la planeación o ejecución de la obra que ustedes hayan identificado o que les haya informado la autoridad local, tachando el recuadro correspondiente:

a) No, porque no hubo cambios. [✓]
b) Sí, en el monto. [ ]
c) Sí, en las fechas. [ ]
d) Sí, en la ubicación. [ ]
e) Sí, en las características de la obra. [ ]

4a. En caso de responder que sí, escriban en qué consistió dicho cambio.

5. En caso de que haya existido algún cambio en la planeación o ejecución de la obra, expliquen cuál fue la razón de dicho cambio.

PRESIDENCIA MUNICIPAL: HIDALGO ESQUINA CON ZARAGOZA S/N COL. CENTRO C.P. 63200
TUXPAN, NAYARIT. MEXICO.

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

6. Tachen la opción que indique cuánto ha avanzado la obra desde su inicio hasta la fecha de visita de seguimiento:

Nada (0%) ☐ Poco (10%) ☑ Regular (50%) ☐ Mucho (90%) ☐

7. Escriban en sus propias palabras cuál es el avance de la obra hasta el momento de la visita de seguimiento a la obra:

Se encuentra en el lugar el personal y la maquinaria para realizar los trabajos

8. Indiquen cuáles de las siguientes acciones han realizado como integrantes del Comité de participación social, tachando el recuadro correspondiente (se puede indicar más de una opción).

a) Participar en la capacitación que debió brindar el gobierno local. ☑
b) Participar en el proceso de planeación y priorización de proyectos en coordinación con las autoridades locales. ☑
c) Realizar visitas de seguimiento a la obra para verificar su inicio y avance. ☑
d) Informar de los avances de la obra a las personas de su localidad. ☐
e) Otra. ☐

8a. En caso de haber realizado otras acciones, escríbanlas a continuación.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPCIÓN SOCIAL

Guillermo Landa Mazariegos Guillermo Landa

Presidenta(e)
Nombre completo y firma

Luis Alberto

Luis Alberto Cedano Benitez

Secretaria(o)
Nombre completo y firma

Miguel A Perez

Vocal
Nombre completo y firma

Miguel Angel Perez Leyva

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

Carlos Abel Garcia B

Carlos Abel Garcia Brambila

Vocal
Nombre completo y firma

Vocal
Nombre completo y firma

Gustavo Cervantes Benitez.

Supervisor de obra
Nombre completo y firma

ANEXO 3. REPORTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS

DATOS DE LA OBRA *Esta sección deberá ser llenada por la supervisión de obra.		
Fecha de llenado: 24 de Abril de 2023		
Nombre de la obra: Bacheo asfaltico en calle Hidalgo Ote. entre calle reforma sur y Calle Mexico Nte. en la localidad de Tuxpan, Municipico de Tuxpan, Nayarit.		
Número de expediente asignado: TUXPAN-RR3-001-2023		Monto total planeado: $151,400.00
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 17/04/2023	Fecha de conclusión: 28/04/2023
Entidad: Nayarit	Municipio: Tuxpan	Localidad: Tuxpan

*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. ¿Se registraron quejas o denuncias? Sí [ ] No [/]

2. Tache si se trata de una queja o una denuncia: Queja [ ] Denuncia [ ]

3. A continuación, tache las opciones que mejor describan su queja o denuncia. Puede seleccionar tantas opciones como sean necesarias.

Quejas	
a. El CPS no recibió la información necesaria para realizar sus funciones.	
b. La obra no se ha desarrollado cumpliendo con los plazos establecidos.	
c. No se han retirado restos de materiales de construcción una vez concluido el proyecto.	
d. Las obras se han desarrollado por la noche y causan problemas a la ciudadanía.	
e. No se tomó en cuenta la participación de la ciudadanía para decidir la obra que se iba a realizar.	
f. No se colocaron señalamientos de precaución, por lo que se pueden generar accidentes.	
g. Existen afectaciones derivadas del desarrollo de la obra (Ej. tuberías dañadas al pavimentar la calle).	
h. Otra	

En caso de seleccionar **h. Otra**, escríbala a continuación:

ANEXO 3. REPORTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Denuncias	
a. La obra no se entregó terminada y funcionando.	
b. La obra no se realizó.	
c. Existen defectos en la calidad de la obra.	
d. El gobierno local benefició a familiares, amigos, socios, allegados suyos o personas servidoras públicas con la contratación de la obra.	
e. El gobierno local pretende constituir el CPS con familiares, amigos, allegados suyos o personas funcionarias públicas.	
f. Los recursos del FAIS se están usando con fines electorales.	

4. A continuación, describa la queja o denuncia con sus propias palabras.

_____

_____

_____

_____

5. ¿Presentó la queja o denuncia ante alguna autoridad? Sí ☐ No ☐

5a. En caso de haber presentado la queja o denuncia ante alguna autoridad, favor de indicar a cuál, así como algún otro dato que pueda identificarla (puede ser el folio de seguimiento, número de expediente, número telefónico, correo electrónico).

_____

_____

6. ¿Desea que el presente reporte sea anónimo? Sí ☐ No ☐

En caso de que quiera identificarse, indique la información que se solicita a continuación:

Nombre: _____

Sexo: Masculino ☐ Femenino ☐ Edad: _____

Ocupación: _____

Datos de contacto (teléfono y correo electrónico): _____

ANEXO 3. REPORTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Guillermo Landa Mazariegos — **Presidenta(e) del Comité de participación social**
Nombre completo y firma

Gustavo Cervantes Benitez — **Supervisor de obra**
Nombre completo y firma

Los datos que comparta no se harán públicos y serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable.

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

4.1 ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN **Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente para las personas beneficiadas**

Siendo el día 28 del mes de Abril del año 2023, a las 10:00 horas en el domicilio Calle Hidalgo Esq. Con Constitución S/N, localizado en el municipio Tuxpan, de la entidad federativa Nayarit, la autoridad local, representada por la supervisión de obra en conjunto con el Comité de participación social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra realizada con recursos del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera, según las siguientes especificaciones:

DATOS DE LA OBRA *Esta sección deberá ser llenada por la supervisión de obra.		
Fecha de llenado:	28 de Abril de 2023	
Nombre de la obra: Bacheo asfaltico en calle Hidalgo OTE entre calle reforma sur y calle Mexico Nte. en la localidad de Tuxpan, Municipio de Tuxpan, Nayarit.		
Número de expediente asignado: TUXPAN-R23-001-2023	Monto total planeado: $151,400.00	
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 17/04/2023	Fecha de conclusión: 28/04/2023
Entidad: Nayarit	Municipio: Tuxpan	Localidad: Tuxpan

Una vez celebrada la entrega y verificación de la obra, mediante su recorrido de inspección por parte de las autoridades municipales y las personas integrantes del Comité de participación social, se concluye que la obra se encuentra concluida y funcionando conforme a lo previsto en el programa de ejecución según las especificaciones y la inversión ejercida para esta.

ENTREGA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Gustavo Cervantes Benitez

Supervisor de obra
Nombre completo y firma

RECIBE EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Guillermo Landa Mazariegos Guillermo Landa

Presidenta(e)
Nombre completo y firma

Luis Alberto

Luis Alberto Cedano Benitez

Secretaria(o)
Nombre completo y firma

Miguel Angel Perez Leyva

Vocal
Nombre completo y firma

Carlos Abel Garcia B

Carlos Abel Garcia Brambila

Vocal
Nombre completo y firma

Vocal
Nombre completo y firma

Testigo
Nombre completo y firma

Testigo
Nombre completo y firma

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

DATOS DE LA OBRA *Esta sección deberá ser llenada por la supervisión de obra.		
Fecha de llenado: 28 de Abril de 2023		
Nombre de la obra: Bacheo asfaltico en calle Hidalgo Ote. entre calle reforma sur y calle Mexico Nte. en la localidad de Tuxpan, Municipio de Tuxpan, Nayarit.		
Número de expediente asignado: TUXPAN-R23-001-2023	Monto total planeado: $151,400.00	
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 17/04/2023	Fecha de conclusión: 28/04/2023
Entidad: Nayarit	Municipio: Tuxpan	Localidad: Tuxpan

4.2. REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. Indiquen el número veces que visitaron la obra durante su inicio, desarrollo y conclusión:

[1]

2. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó la autoridad local?

a) Sí. [✓]
b) No, concluyó antes de la fecha informada. [ ]
c) No, concluyó después de la fecha informada. [ ]
d) No ha concluido. [ ]

2a. ¿En caso de que la obra no esté concluida, qué fecha tentativa informó la autoridad local para su conclusión?

3. ¿Ustedes (CPS) estuvieron presentes en la entrega de la obra? Sí [✓] No [ ]

3a. En caso de responder que no, ¿por qué no estuvieron presentes?

4. ¿La obra se entregó terminada y funcionando? Sí [✓] No [ ]

4a. En caso de responder que no, ¿por qué no se terminó o por qué no funciona la obra?

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

5. ¿Ustedes (CPS) recibieron por parte de la autoridad local el acta entrega-recepción? Sí [x] No [ ]

6. ¿La autoridad local colocó la placa de conclusión de la obra? Sí [ ] No [x]

7. De los siguientes mecanismos, tachen aquellos que utilizaron para comunicar a la ciudadanía las actividades de seguimiento a las obras del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera:

a) No las comunicaron. [ ]
b) Juntas vecinales o comunitarias. [x]
c) Carteles informativos. [ ]
d) Perifoneo (altavoces, etc.). [ ]
e) A través de redes sociales (Facebook, grupos de WhatsApp, etc.). [x]
f) Otros. [ ]

7a. Si se utilizaron otros mecanismos, ¿cuáles fueron?

_____

8. Mencionen dos resultados o beneficios obtenidos en su comunidad con el trabajo realizado por ustedes a través de su participación en el CPS del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera.

_____
_____
_____

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPCIÓN SOCIAL

Guillermo Landa Mazariegos

Presidenta(e)
Nombre completo y firma

Luis Alberto

Luis Alberto Cervio Benitez

Secretaria(o)
Nombre completo y firma

Carlos Abel Garcia B

Carlos Abel Garcia Brambila

Vocal
Nombre completo y firma

Miguel A

Vocal
Nombre completo y firma

Miguel Angel Perez Reyes

Jose Reyes

Vocal
Nombre completo y firma

Gustavo Cervantes Benitez

Supervisor de obra
Nombre completo y firma

https://tuxpan.gob.mx/wp-content/uploads/2023/08/REPORTE-SUPERVISON-OBRA-ANEXOS-DE-PARTISIPACION-SOCIAL-MTN-18-R23-002-2023.pdf

26 de mayo de 2023.

REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA.


DATOS GENERALES:


- **Nombre de la obra:** REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y PUENTE TUXPAN SAN VICENTE DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN; NAYARIT
- **Número de contrato:** MTN-18-R23-002/2023-AD
- **Adjudicación:** A la empresa del C. LUIS GILBERTO CÁRDENAS RIVAS.
- **Monto de la obra:** $174,519.91 (Ciento Setenta y Cuatro Mil Quinientos Diecinueve pesos 91/100 M.N.) IVA incluida.
- **Periodo de ejecución:** De 11 días naturales comprendiendo del 16 de mayo de 2023 al 26 de mayo de 2023.

PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Inicio de la obra:

Para el inicio de los trabajos de la obra, se observa a personal, maquinaria y herramienta suficiente en el tramo de la calle México esquina con calle Hidalgo para reparar la superficie daña.

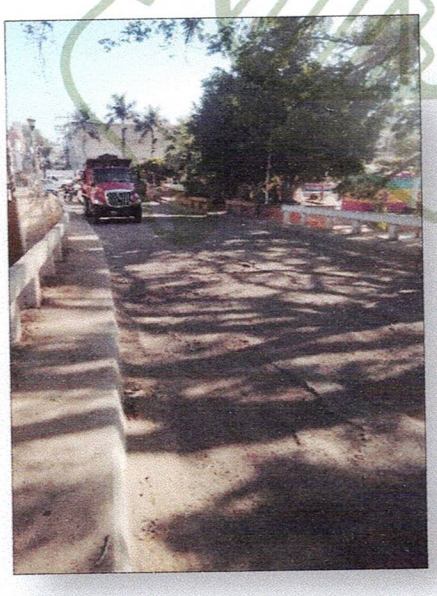

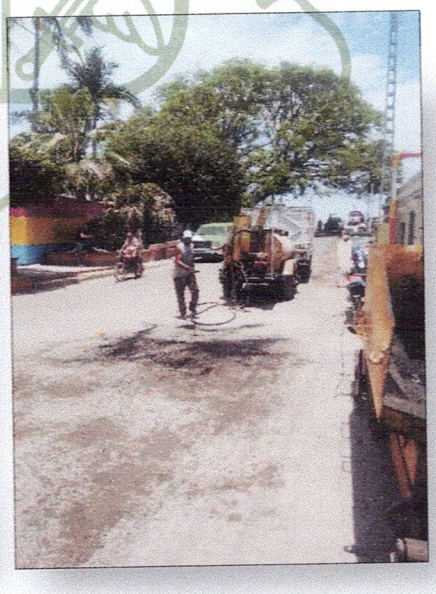



Durante la ejecución de la obra:


Se observa el área del carril derecho limpia, personal capacitado realizar el riego de liga con emulsión asfáltica ECR-60 A razón de 0.60 – 0.90 lts/m2 en el área a rehabilitar.

Personal realizar el poreo en el área que ya cuentan con el riego de liga, se puede visualizar a la pavimentadora finisher tender la mezcla asfáltica en caliente de 1/2", personal capacitado compacta con el compactador de rodillo las áreas donde ya se encuentra la mezcla asfáltica tendida.



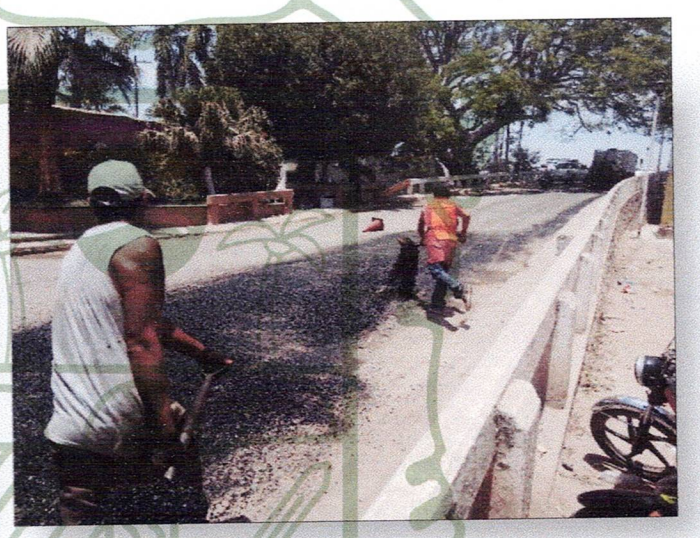


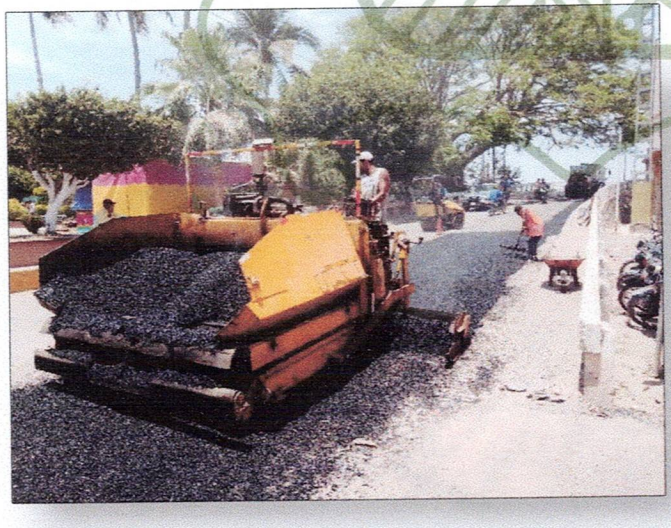

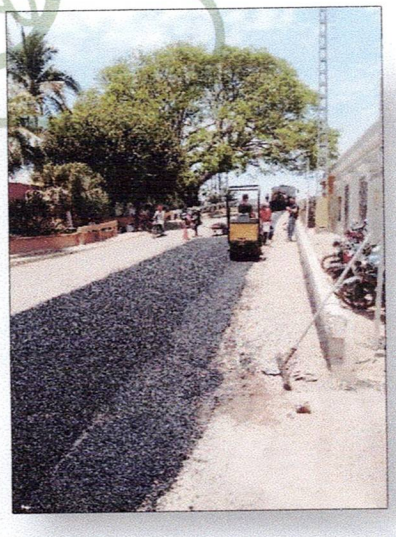

Conclusión de la ejecución de la obra:

Se concluye que ya se encuentran finalizados los trabajos de ambos laterales que comprenden de 320.00 metros cuadrados de rehabilitación de pavimento asfaltico en la calle México entre la calle Hidalgo y puente Tuxpan san Vicente de la localidad de Tuxpan, municipio de Tuxpan Nayarit.
Se puede visualizar que no se encuentran desperfectos en la superficie, observando esto se afirma que se encuentran completamente desarrollados al 100% y operando correctamente todos los trabajos

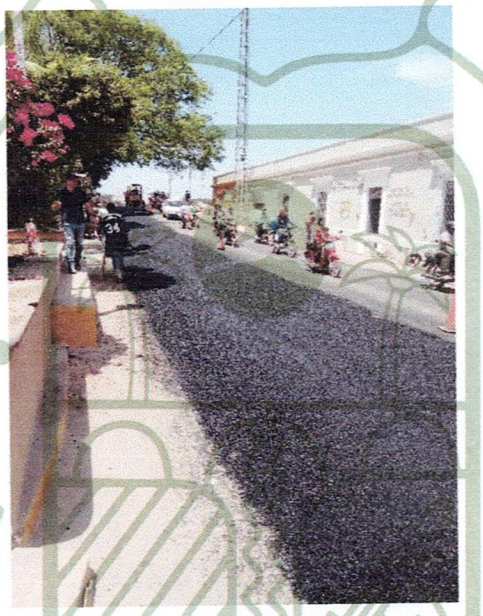

Supervisor de obra.
ING. GUSTAVO CERVANTES BENITEZ.

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

1.1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Siendo el día 08 del mes de Mayo del año 2023, a las 10:00 horas en el domicilio Calle Mexico Esq. con Hidalgo S/N, localizado en el municipio Tuxpan, de la entidad federativa Nayarit, nos encontramos reunidos para celebrar la instalación del Comité de participación social que dará seguimiento y verificación a la obra de nombre Rehabilitacion de pavimento asfaltico en calle Mexico a realizarse con recursos del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

DATOS DE LA OBRA *Esta sección deberá ser llenada por la supervisión de obra		
Fecha de llenado: 08 de Mayo de 2023		
Nombre de la obra: Rehabilitacion de pavimento asfaltico en calle Mexico entre la calle Hidalgo y Puente Tuxpan San Vicente de la localidad de Tuxpan, Municipio de Tuxpan, Nayarit.		
Número de expediente asignado: TUXPAN-RZS-002-2023	Monto total planeado: 26/05/2023	
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 16/05/2023	Fecha de conclusión: $174,520.00
Entidad: Nayarit	Municipio: Tuxpan	Localidad: Tuxpan

CONSIDERANDOS

Que las autoridades locales y personas servidoras públicas que apoyen en los procesos relacionados con el Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera, deberán:

- Promover la participación de la población beneficiaria a través de la integración de los Comités de participación social (CPS) durante los procesos de identificación de necesidades, planeación, ejecución y seguimiento de las obras a realizar con el Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera conforme al artículo 33, apartado B, fracción II, inciso b) de la Ley de Coordinación Fiscal.

- Capacitar a los CPS sobre los objetivos del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera, su población objetivo, labores y responsabilidades de los CPS.

- Publicar los anexos de participación social en el sitio oficial del ayuntamiento Municipal.

Que los Comités de participación social (CPS):

- Son órganos de participación y representación ciudadana rural, urbana, indígena o afromexicana, integrados equitativamente por mujeres y hombres en la mayoría de sus diversidades, electos de manera democrática para dar seguimiento a las obras financiadas con recursos del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera. También se reconocen como tales a las distintas formas de organización ciudadana con las que ya cuenta una localidad, siempre y cuando se apeguen a los criterios de la Guía de participación social vigente publicada por Bienestar.

- Su objetivo es dar seguimiento al inicio, desarrollo y conclusión de las obras/acciones a realizar con recursos del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera, para contribuir a que los recursos se utilicen bajo los principios de transparencia, economía, eficacia, legalidad y honradez.

- Deberán estar conformados por personas de la localidad donde se realice la obra y que no estén desempeñando un cargo público.

- La participación de la ciudadanía en los CPS no es remunerada; se trata de cargos honoríficos de servicio a la comunidad.

Que las actividades de los CPS son:

- Participar en la capacitación que brindará el gobierno local sobre las responsabilidades como integrantes de los CPS y de las obras a las que darán seguimiento.

- Participar en los procesos de planeación de proyectos en coordinación con las autoridades locales, mientras se apeguen a los Lineamientos del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera y a la disponibilidad de recursos.

- Realizar visitas a las obras e informar de sus avances, así como de la conclusión de las mismas a la ciudadanía.

- Registrar el seguimiento de las obras mediante el correcto llenado de los anexos de participación social vigentes.

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

ACUERDO ÚNICO

Se declara formalmente instalado el Comité de participación social conformado por las personas que al calce de este documento firman.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Miguel A Perez

Presidenta(e)
Nombre completo y firma

Miguel Angel Perez Leyva

Edwin Daniel B.S.
Edwin Daniel Benitez Salas

Secretaria(o)
Nombre completo y firma

Jose Reyes

Vocal
Nombre completo y firma

Carlos Abel Garcia B

Carlos Abel Garcia Brambila

Vocal
Nombre completo y firma

Guillermo Landa

Guillermo Landa Mazariegos

Vocal
Nombre completo y firma

Gustavo Cervantes

GUSTAVO CERVANTES BENITEZ

Supervisor de obra
Nombre completo y firma

Testigo
Nombre completo y firma

Testigo
Nombre completo y firma

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

1.2.

REPORTE DE CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

DATOS DE LA CAPACITACIÓN *Esta sección deberá ser llenada por la supervisión de obra		
Fecha y hora de la capacitación: 08 de Mayo de 2023 11:00 AM		
Lugar de la capacitación: Sala de reuniones de la DGIDS		
Nombre y cargo de la persona facilitadora: Salvador Lares Lizarraga Director General de Infraestructura y Desarrollo Sustentable		
Número de asistentes a la capacitación	Mujeres: 0	Hombres: 5

INFORMACIÓN SOBRE LA CAPACITACIÓN *Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

Responda las siguientes preguntas tachando el recuadro correspondiente:

1. ¿La obra fue acordada con las personas del CPS y de la localidad beneficiaria? Sí [X] No [ ]

2. Indique cuáles de los siguientes temas les fueron proporcionados durante la capacitación:

   a) ¿Qué es el Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera, a quiénes beneficia, qué tipos de obras se pueden realizar con él y cuál es la importancia de que la ciudadanía participe? Sí [X] No [ ]
   b) ¿Cuáles son sus actividades y responsabilidades como integrantes del CPS? Sí [X] No [ ]
   c) Características básicas de la obra: cuándo inicia, cuándo termina, cuánto va a costar, cómo quedará al finalizar. Sí [X] No [ ]
   d) ¿Se entregaron los trípticos de participación social y de información del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera a todo el CPS? Sí [X] No [ ]

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

ACUERDO ÚNICO

Se declara formalmente instalado el Comité de participación social conformado por las personas que al calce de este documento firman.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Miguel A Perez

Miguel A Perez

Presidenta(e)
Nombre completo y firma

Miguel Angel Perez Leyva

Edwin Daniel B.S.

Edwin Daniel Benitez Salas

Secretaria(o)
Nombre completo y firma

Jose Reyes

Vocal
Nombre completo y firma

Carlos Abel Garcia B

Carlos Abel Garcia Brambila

Vocal
Nombre completo y firma

Guillermo Landa

Guillermo Landa Mazariegos

Vocal
Nombre completo y firma

Gustavo Cervantes

GUSTAVO CERVANTES BENITEZ

Supervisor de obra
Nombre completo y firma

Testigo
Nombre completo y firma

Testigo
Nombre completo y firma

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

DATOS DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
Nombre de C. Presidenta/e: Miguel Angel Perez Leyva
Domicilio y número telefónico: Col. Piña Calle 12 de Octubre Lte. 8 MZA. 43. Tuxpan Nay. Tel. 323 232 2562
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☐ NO ☑ En caso de responder sí, indique a cuál.
Nombre de C. Secretaria/o: Edwin Daniel Benitez Salas
Domicilio y número telefónico: C. Rey Nayar S/N, col. Ricardo Flores Magon 63243 Tuxpan, Nay. Tel: 323 118 1295.
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☐ NO ☑ En caso de responder sí, indique a cuál.
Nombre de C. Vocal: Guillermo Landa Mazariegos
Domicilio y número telefónico: Queretaro #24, zona centro C.P. 63200. Tuxpan Nayarit. Tel: 323 132 5349
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☐ NO ☑ En caso de responder sí, indique a cuál.
Nombre de C. Vocal: Carlos Abel Garcia Brambila
Domicilio y número telefónico: Narciso Mendoza #307. col. centro Tuxpan Nayarit. Tel. 323 124 1486.
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☐ NO ☑ En caso de responder sí, indique a cuál.
Nombre de C. Vocal: Jose Luis Reyez Zarate
Domicilio y número telefónico: And. Mz. F8B col. Emiliano Zapata 63200 Tuxpan, Nay. Tel: 323 131 9864
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☐ NO ☑ En caso de responder sí, indique a cuál.

¿Para qué utilizaremos sus datos personales?

La Dirección General de Infraestructura y Desarrollo Sustentable, Nayarit utiliza los datos personales para dar seguimiento a la participación social mediante mecanismos internos apegados a los Lineamientos del Fondo, no se harán públicos y serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable.

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA *Esta sección deberá ser llenada por la supervisión de obra.			
Fecha de llenado: 16 de Mayo de 2023			
Nombre de la obra: Rehabilitacion de pavimento asfaltico en calle Mexico entre la calle Hidalgo y Puente Tuxpan San Vicente de la localidad de Tuxpan, Municipio de Tuxpan, Nayarit.			
Número de expediente asignado: TUXPAN-223-002-2023		Monto total planeado: $174,580.00	
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 16/05/2023	Fecha de conclusión: 26/05/2023	
Entidad: Nayarit	Municipio: Tuxpan	Localidad: Tuxpan	

SEGUIMIENTO DE LA OBRA *Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. Describan con sus propias palabras en qué consiste la obra que supervisan.

SE REHABILITARA CON PAVIMENTO LA CALLE MEXICO

2. Describan con sus propias palabras de qué manera beneficiará la obra a la localidad.

FACILITARA EL ACCESO AL MUNICIPIO.

3. ¿La obra inició en la fecha que informó la autoridad local? Sí [x] NO [ ]

3a. En caso de que no, ¿qué justificación dio la autoridad local?

4. Indiquen si existió algún cambio en la planeación o ejecución de la obra que ustedes hayan identificado o que les haya informado la autoridad local, tachando el recuadro correspondiente:

a) No, porque no hubo cambios. [x]
b) Sí, en el monto. [ ]
c) Sí, en las fechas. [ ]
d) Sí, en la ubicación. [ ]
e) Sí, en las características de la obra. [ ]

4a. En caso de responder que sí, escriban en qué consistió dicho cambio.

5. En caso de que haya existido algún cambio en la planeación o ejecución de la obra, expliquen cuál fue la razón de dicho cambio.

PRESIDENCIA MUNICIPAL: HIDALGO ESQUINA CON ZARAGOZA S/N COL. CENTRO C.P. 63200
TUXPAN, NAYARIT. MEXICO.

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

6. Tachen la opción que indique cuánto ha avanzado la obra desde su inicio hasta la fecha de visita de seguimiento:

Nada (0%) ☐ Poco (10%) ☑ Regular (50%) ☐ Mucho (90%) ☐

7. Escriban en sus propias palabras cuál es el avance de la obra hasta el momento de la visita de seguimiento a la obra:

SE ENCUENTRA MAQUINARIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.

8. Indiquen cuáles de las siguientes acciones han realizado como integrantes del Comité de participación social, tachando el recuadro correspondiente (se puede indicar más de una opción).

a) Participar en la capacitación que debió brindar el gobierno local. ☑
b) Participar en el proceso de planeación y priorización de proyectos en coordinación con las autoridades locales. ☑
c) Realizar visitas de seguimiento a la obra para verificar su inicio y avance. ☑
d) Informar de los avances de la obra a las personas de su localidad. ☐
e) Otra. ☐

8a. En caso de haber realizado otras acciones, escríbanlas a continuación.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPCIÓN SOCIAL

Mire A Perez

Presidenta(e)
Nombre completo y firma

Miguel Angel Perez Lerma

Edwin Daniel B.S.

Edwin Daniel Benitez Salas

Secretaria(o)
Nombre completo y firma

Guillermo Landa

Guillermo Landa Mazanegos

Vocal
Nombre completo y firma

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

Carlos Abel Garcia B

Carlos Abel Garcia Brambila

Vocal

Nombre completo y firma

Vocal

Nombre completo y firma

Gustavo Cervantes Benitez

Supervisor de obra

Nombre completo y firma

PRESIDENCIA MUNICIPAL: HIDALGO ESQUINA CON ZARAGOZA S/N COL. CENTRO C.P. 63200
TUXPAN, NAYARIT. MEXICO.

ANEXO 3. REPORTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS

DATOS DE LA OBRA *Esta sección deberá ser llenada por la supervisión de obra.			
Fecha de llenado: 22 de Mayo de 2023			
Nombre de la obra: Rehabilitación de pavimento asfaltico en calle Mexico entre la calle Hidalgo y Puente Tuxpan, San Vicente de la localidad de Tuxpan, Municipio de Tuxpan, Nayarit.			
Número de expediente asignado: TUXPAN-RZ3-002-2023			Monto total planeado: $174,520.00
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 16/05/2023		Fecha de conclusión: 26/05/2023
Entidad: Nayarit	Municipio: Tuxpan		Localidad: Tuxpan

*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. ¿Se registraron quejas o denuncias? Sí [ ] No [X]

2. Tache si se trata de una queja o una denuncia: Queja [ ] Denuncia [ ]

3. A continuación, tache las opciones que mejor describan su queja o denuncia. Puede seleccionar tantas opciones como sean necesarias.

Quejas	
a. El CPS no recibió la información necesaria para realizar sus funciones.	
b. La obra no se ha desarrollado cumpliendo con los plazos establecidos.	
c. No se han retirado restos de materiales de construcción una vez concluido el proyecto.	
d. Las obras se han desarrollado por la noche y causan problemas a la ciudadanía.	
e. No se tomó en cuenta la participación de la ciudadanía para decidir la obra que se iba a realizar.	
f. No se colocaron señalamientos de precaución, por lo que se pueden generar accidentes.	
g. Existen afectaciones derivadas del desarrollo de la obra (Ej. tuberías dañadas al pavimentar la calle).	
h. Otra	

En caso de seleccionar **h. Otra**, escríbala a continuación:

ANEXO 3. REPORTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Denuncias	
a. La obra no se entregó terminada y funcionando.	
b. La obra no se realizó.	
c. Existen defectos en la calidad de la obra.	
d. El gobierno local benefició a familiares, amigos, socios, allegados suyos o personas servidoras públicas con la contratación de la obra.	
e. El gobierno local pretende constituir el CPS con familiares, amigos, allegados suyos o personas funcionarias públicas.	
f. Los recursos del FAIS se están usando con fines electorales.	

4. A continuación, describa la queja o denuncia con sus propias palabras.

_____

_____

_____

_____

5. ¿Presentó la queja o denuncia ante alguna autoridad? Sí ☐ No ☑

5a. En caso de haber presentado la queja o denuncia ante alguna autoridad, favor de indicar a cuál, así como algún otro dato que pueda identificarla (puede ser el folio de seguimiento, número de expediente, número telefónico, correo electrónico).

_____

_____

6. ¿Desea que el presente reporte sea anónimo? Sí ☐ No ☐

En caso de que quiera identificarse, indique la información que se solicita a continuación:

Nombre: _____

Sexo: Masculino ☐ Femenino ☐ Edad: _____

Ocupación: _____

Datos de contacto (teléfono y correo electrónico): _____

ANEXO 3. REPORTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Presidenta(e) del Comité de participación social	**Supervisor de obra**
Nombre completo y firma	Nombre completo y firma
Miguel Angel Perez Leyva	Gustavo Cervantes Benitez

Los datos que comparta no se harán públicos y serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable.

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

4.1 ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN **Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente para las personas beneficiadas**

Siendo el día 26 del mes de Mayo del año 2023, a las 10:00 horas en el domicilio Calle Mexico Esq con Hidalgo S/N, localizado en el municipio Tuxpan, de la entidad federativa Nayarit, la autoridad local, representada por la supervisión de obra en conjunto con el Comité de participación social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra realizada con recursos del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera, según las siguientes especificaciones:

DATOS DE LA OBRA *Esta sección deberá ser llenada por la supervisión de obra.		
Fecha de llenado:	26 de Mayo de 2023	
Nombre de la obra: Rehabilitación de pavimento asfaltico en calle Mexico entre calle Hidalgo y Puente Tuxpan San Vicente de la localidad de Tuxpan, Municipio de Tuxpan, Nayarit.		
Número de expediente asignado: TUXPAN-RZ3-002-2023		Monto total planeado: $174,520.00
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 16/05/2023	Fecha de conclusión: 26/05/2023
Entidad: Nayarit	Municipio: Tuxpan	Localidad: Tuxpan

Una vez celebrada la entrega y verificación de la obra, mediante su recorrido de inspección por parte de las autoridades municipales y las personas integrantes del Comité de participación social, se concluye que la obra se encuentra concluida y funcionando conforme a lo previsto en el programa de ejecución según las especificaciones y la inversión ejercida para esta.

ENTREGA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Gustavo Cervantes Benitez

Supervisor de obra
Nombre completo y firma

RECIBE EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Presidenta(e)
Nombre completo y firma

Edwin Daniel B.S.
Edwin Daniel Benitez Salas

Secretaria(o)
Nombre completo y firma

Miguel Angel Perez Leyva
Guillermo Landa

Guillermo Landa Mazariegos

Vocal
Nombre completo y firma

Carlos Abel Garcia B
Carlos Abel Garcia Brambila

Vocal
Nombre completo y firma

Vocal
Nombre completo y firma

Testigo
Nombre completo y firma

Testigo
Nombre completo y firma

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

DATOS DE LA OBRA *Esta sección deberá ser llenada por la supervisión de obra.		
Fecha de llenado:		
Nombre de la obra:		
Número de expediente asignado:		Monto total planeado:
Periodo de ejecución	Fecha de inicio:	Fecha de conclusión:
Entidad:	Municipio:	Localidad:

4.2. REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. Indiquen el número veces que visitaron la obra durante su inicio, desarrollo y conclusión:

[1]

2. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó la autoridad local?

a) Sí. [✓]
b) No, concluyó antes de la fecha informada. [ ]
c) No, concluyó después de la fecha informada. [ ]
d) No ha concluido. [ ]

2a. ¿En caso de que la obra no esté concluida, qué fecha tentativa informó la autoridad local para su conclusión?

3. ¿Ustedes (CPS) estuvieron presentes en la entrega de la obra? Sí [✓] No [ ]

3a. En caso de responder que no, ¿por qué no estuvieron presentes?

4. ¿La obra se entregó terminada y funcionando? Sí [✓] No [ ]

4a. En caso de responder que no, ¿por qué no se terminó o por qué no funciona la obra?

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

5. ¿Ustedes (CPS) recibieron por parte de la autoridad local el acta entrega-recepción? Sí [/] No [ ]

6. ¿La autoridad local colocó la placa de conclusión de la obra? Sí [ ] No [/]

7. De los siguientes mecanismos, tachen aquellos que utilizaron para comunicar a la ciudadanía las actividades de seguimiento a las obras del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera:

a) No las comunicaron. [ ]
b) Juntas vecinales o comunitarias. [/]
c) Carteles informativos. [ ]
d) Perifoneo (altavoces, etc.). [ ]
e) A través de redes sociales (Facebook, grupos de WhatsApp, etc.). [/]
f) Otros. [ ]

7a. Si se utilizaron otros mecanismos, ¿cuáles fueron?

_____

8. Mencionen dos resultados o beneficios obtenidos en su comunidad con el trabajo realizado por ustedes a través de su participación en el CPS del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera.

_____
_____
_____

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPCIÓN SOCIAL

Mabel A Peres

Presidenta(e)
Nombre completo y firma

Edwin Daniel B.S.

Edwin Daniel Benitez Solas

Secretaria(o)
Nombre completo y firma

Miguel Angel Perez Tesorero

Guillermo Landa

Guillermo Landa Marangos

Vocal
Nombre completo y firma

Carlos Abel Garcia B

Carlos Abel Garcia Brambila

Vocal
Nombre completo y firma

Vocal
Nombre completo y firma

Gustavo Centantos Benitez

Supervisor de obra
Nombre completo y firma
